兴燊环境技术（深圳）有限公司

专业环保工程解决方案提供商

联系人：郑生　电话：18938996166　邮箱：519733058@qq.com　发货地址：东莞中堂镇北王路中堂段59号4栋103室

污水处理工程方案与报价单


广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目-倒班楼污水处理

项目概况

项目名称：	广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目-倒班楼污水处理	**处理水量：**	60 m^3/天	**调节池规格：**	5m×3m×2m（长×宽×高）
提升泵配置：	一用一备，功率2.2KW，Q=5m^3/h，H=15m	**设备材质：**	碳钢6mm板，内外环氧煤沥青防腐	**安装方式：**	地埋一体化，工厂预制，现场吊装拼接
排放标准：	直排到雨水管网	**报价日期：**	2026年02月16日	**交货地址：**	广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿项目-倒班楼工地现场

污水处理工艺流程

针对本项目60m^3/天的生活污水处理需求，采用成熟的"A/O生物处理+深度处理"工艺，确保出水达到直排雨水管网标准。具体工艺流程如下：

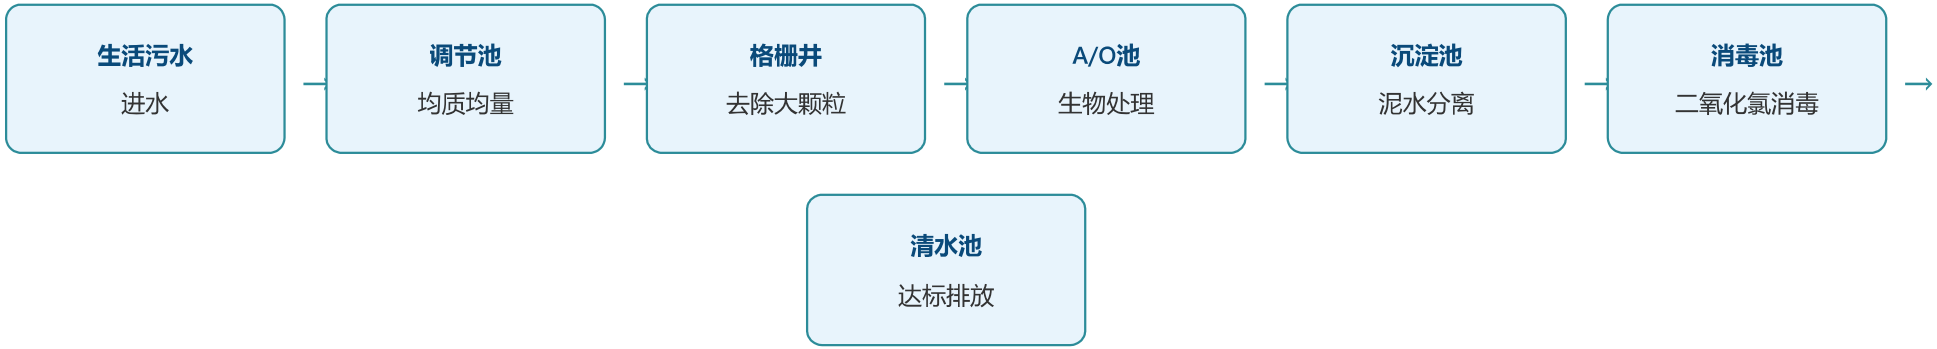

工艺说明：生活污水首先进入调节池进行水质水量的调节，然后通过机械格栅去除大颗粒悬浮物。随后污水进入A/O生物处理单元，通过缺氧和好氧过程去除有机物和氮磷污染物。经沉淀池进行泥水分离后，出水进入消毒池进行消毒处理，最终达标排放至雨水管网。

污水处理设备配置清单

序号	设备名称	型号规格/参数	单位	数量	含税单价(元)	含税总价(元)
一、调节池设备						
1	碳钢调节池	碳钢6mm板，内外环氧煤沥青防腐，尺寸5×3×2m，容积30m³	座	1	32,500.00	32,500.00
2	调节池提升泵	QW型潜水排污泵，2.2KW，Q=5m³/h，H=15m，一用一备	台	2	3,250.00	6,500.00
3	提升泵浮球开关	不锈钢材质，高低液位控制	套	2	380.00	760.00
4	调节池进水格栅	不锈钢人工格栅，栅隙20mm	套	1	1,200.00	1,200.00
5	调节池通风系统	UPVC通风管、防雨帽等	套	1	850.00	850.00
二、主体处理设备						
6	A/O一体化污水处理设备	碳钢防腐，处理量60m³/d，尺寸8×3×3m，含缺氧池、好氧池、沉淀池	套	1	156,000.00	156,000.00

序号	设备名称	型号规格/参数	单位	数量	含税单价(元)	含税总价(元)
7	机械格栅	HF-500，栅隙5mm，N=0.75KW	台	1	12,500.00	12,500.00
8	曝气风机	HC-501S，2.2KW，Q=2.45m³/min，P=34.3kPa	台	2	6,800.00	13,600.00
9	污泥回流泵	QW型潜水排污泵，1.5KW，Q=5m³/h，H=10m	台	2	2,950.00	5,900.00
10	二氧化氯发生器	H2000-100，产氯量100g/h	套	1	9,800.00	9,800.00
11	电控柜	PLC自动控制，含触摸屏，可远程监控	套	1	18,500.00	18,500.00
三、管道及电气系统						
12	工艺管道系统	UPVC管道、阀门、管件、支架等	套	1	15,000.00	15,000.00
13	电缆及桥架	国标铜芯电缆、桥架及辅材	套	1	8,200.00	8,200.00
设备小计					**281,310.00**	
四、安装调试及服务						

序号	设备名称	型号规格/参数	单位	数量	含税单价(元)	含税总价(元)
14	设备运输费	东莞中堂→阳西县溪头镇（约280公里，含吊装费）	项	1	8,500.00	8,500.00
15	安装调试费	现场吊装、拼接、安装、调试（含人工、机械）	项	1	25,000.00	25,000.00
16	调试药剂及菌种	生物菌种、营养剂、PAC、PAM等调试用药剂	批	1	6,500.00	6,500.00
17	技术培训费	操作维护培训（2-3人，2天）	项	1	3,000.00	3,000.00
18	税费	增值税13%	项	1	42,200.30	42,200.30
工程总价（含税）					**366,510.30**	

人民币大写：叁拾陆万陆仟伍佰壹拾元叁角整

备注：

1. 本报价含设备运输、安装、调试、调试药剂及菌种、操作人员培训费用；
2. 调节池采用碳钢6mm板，内外环氧煤沥青防腐，与一体化污水处理设备同材质；
3. 提升泵参数：QW型潜水排污泵，2.2KW，Q=5m^3/h，H=15m，一用一备；
4. 本报价为含税价，税率13%，开具增值税专用发票；
5. 设备材质为碳钢6mm板，内外环氧煤沥青防腐，地埋式安装；
6. 交货期：合同签订后30天内交货并安装调试完成；

7. 质保期：设备主体质保一年，电机、泵类质保一年，终身维修；
8. 付款方式：合同签订后预付30%，发货前付50%，安装调试完一次性付清；
9. 本报价有效期：自报价之日起30天内有效。

公司账户信息

公司名称：
兴燊环境技术（深圳）有限公司

纳税人识别号：
914403000769128313

开户银行：
中国建设银行深圳翠竹支行

银行账号：
44201011200052542287

银行行号：
105584000771

联系人：
郑生 18938996166

服务承诺

1. **质量保证：**所有设备均为全新原厂正品，符合国家相关质量标准。
2. **技术支持：**提供7×24小时技术咨询服务，快速响应客户需求。
3. **安装调试：**由专业工程师现场指导安装调试，包含调试所需药剂和菌种，确保设备正常运行。
4. **操作培训：**免费为甲方操作人员提供系统操作和维护培训。
5. **售后服务：**质保期内免费维修更换故障部件，质保期后提供成本价维修服务。

签章确认

供应商：兴燊环境技术（深圳）有限公司

授权代表签字：

日期：2026年02月16日

采购方：

授权代表签字：

日期：

报价专用章

公司盖章：

公司盖章：
